

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)


Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er sel 2º sen 1er sel 2º sen 1er sel
1			FACULTAD DE ARTE TEATRAL	284 días?	jue 30/11/23	mar 31/12/24	
2			Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 5 (PE:	139 días	jue 30/11/23	mar 11/06/24	
3			FACILIDADES TEMPORALES- SERVIQUIMICA	8 días	jue 30/11/23	mar 12/12/23	
4			Construccion de Cerca Perimetral	6 días	jue 30/11/23	jue 07/12/23	
5			Sum. Tejas Galvanizadas	0 días	jue 30/11/23	jue 30/11/23	30/11
6			Iluminacion con Reflectores (incluye cableado y	5 días	vie 01/12/23	jue 07/12/23	
7			Sum. Reflectores	0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	01/12
8			Sum. Cables, tuberias y accesorios	0 días	vie 01/12/23	vie 01/12/23	01/12
9			Montaje de 3 Garitas-Existe Suministro ISA	2 días	vie 08/12/23	lun 11/12/23	
10			Garantizar Agentes de Seguridad-ISA	0 días	mar 12/12/23	mar 12/12/23	12/12
11			CUBIERTA BLOQUE 5	45 días	jue 07/12/23	mié 07/02/24	
12			[1306] Impermeabilizaciones	45 días	jue 07/12/23	mié 07/02/24	
13			SERVIQUIMICA	45 días	jue 07/12/23	mié 07/02/24	
14			[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	3 días	jue 07/12/23	lun 11/12/23	
15			[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO	12 días	mar 12/12/23	mié 27/12/23	
16			[126411] Colocacion de RasillasDE 290 X 140 X 12.5 MM	25 días	jue 28/12/23	mié 31/01/24	
17			Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	28/12
18			Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	28/12
19			Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	jue 28/12/23	jue 28/12/23	28/12
20			[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de	5 días	jue 01/02/24	mié 07/02/24	
21			Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	jue 01/02/24	jue 01/02/24	01/02
22			[169012] LIMPIEZA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE HO FO O	1 día	mar 12/12/23	mar 12/12/23	
23			[179901] EXPLORACION SANITARIA PARA LOCALIZACION	1 día	mié 13/12/23	mié 13/12/23	
24			[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	7 días	mar 12/12/23	mié 20/12/23	
25			INTERIOR TECHOS	40 días	jue 08/02/24	mié 03/04/24	
26			[1306] Impermeabilizaciones	40 días	jue 08/02/24	mié 03/04/24	
27			SERVIQUIMICA	40 días	jue 08/02/24	mié 03/04/24	
28			[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	2 días	jue 08/02/24	vie 09/02/24	
29			[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según	10 días	lun 12/02/24	vie 23/02/24	
30			Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)	0 días	lun 12/02/24	lun 12/02/24	12/02

CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem				
						Diagrama de Gantt				
31		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte	0 días	lun 12/02/24	lun 12/02/24					
32		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X	20 días	lun 04/03/24	vie 29/03/24					
33		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	lun 01/04/24	lun 01/04/24					
34		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	lun 01/04/24	mié 03/04/24					
35		MUROS	49 días	jue 04/04/24	mar 11/06/24					
36		[1301] Albañileria	32 días	jue 04/04/24	vie 17/05/24					
37		SERVIQUIMICA	32 días	jue 04/04/24	vie 17/05/24					
38		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10	7 días	jue 04/04/24	vie 12/04/24					
39		[039322]RESTAURACION DE MUROS INTERIOR 0.115 M DE	13 días	lun 15/04/24	mié 01/05/24					
40		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME	0 días	lun 15/04/24	lun 15/04/24					
41		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	0 días	lun 15/04/24	lun 15/04/24					
42		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M	4 días	jue 02/05/24	mar 07/05/24					
43		Sum. Electrodo E360	0 días	jue 02/05/24	jue 02/05/24					
44		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES	5 días	mié 08/05/24	mar 14/05/24					
45		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	mié 15/05/24	vie 17/05/24					
46		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	20 días	mar 14/05/24	mar 11/06/24					
47		Sum. Hdrosanitaria Importacion	0 días	lun 20/05/24	lun 20/05/24					
48		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS	20 días	mié 08/05/24	mar 04/06/24					
49		Sum. Empotramientos electricos	0 días	lun 20/05/24	lun 20/05/24					
50		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 4 (PE:	167 días?	mié 10/01/24	jue 29/08/24					
51		CUBIERTA BLOQUE 4- FCBC	65 días	mié 10/01/24	mar 09/04/24					
52		[1306] Impermeabilizaciones	65 días	mié 10/01/24	mar 09/04/24					
53		ARTIMARCO FCBC	65 días	mié 10/01/24	mar 09/04/24					
54		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	3 días	mié 10/01/24	vie 12/01/24					
55		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO	22 días	lun 15/01/24	mar 13/02/24					
56		[126411] Colocacion de Rasillas DE 290 X 140 X 12.5 MM	35 días	mié 14/02/24	mar 02/04/24					
57		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	mié 14/02/24	mié 14/02/24					
58		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica	0 días	mié 14/02/24	mié 14/02/24					
59		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	mié 14/02/24	mié 14/02/24					
60		[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de	5 días	mié 03/04/24	mar 09/04/24					


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
						1er sel	2° sen	1er sel	2° sen	1er sel
61		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	mié 03/04/24	mié 03/04/24					
62		[169012] LIMPIEZA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE HO FO O	2 días	lun 15/01/24	mar 16/01/24					
63		[179901] EXPLORACION SANITARIA PARA LOCALIZACION	2 días	mié 17/01/24	jue 18/01/24					
64		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	15 días	lun 15/01/24	vie 02/02/24					
65		INTERIOR TECHOS	55 días	mié 10/04/24	mar 25/06/24					
66		[1306] Impermeabilizaciones	55 días	mié 10/04/24	mar 25/06/24					
67		SERVIQUIMICA	55 días	mié 10/04/24	mar 25/06/24					
68		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	2 días	mié 10/04/24	jue 11/04/24					
69		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según	20 días	vie 12/04/24	jue 09/05/24					
70		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)	0 días	vie 12/04/24	vie 12/04/24					
71		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte	0 días	vie 12/04/24	vie 12/04/24					
72		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X	30 días	vie 10/05/24	jue 20/06/24					
73		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	jue 20/06/24	jue 20/06/24					
74		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	vie 21/06/24	mar 25/06/24					
75		MUROS	47 días?	mié 26/06/24	jue 29/08/24					
76		[1301] Albañileria	32 días?	mié 26/06/24	jue 08/08/24					
77		SERVIQUIMICA	32 días?	mié 26/06/24	jue 08/08/24					
78		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10	7 días	mié 26/06/24	jue 04/07/24					
79		[039322]RESTAURACION DE MUROS INTERIOR 0.115 M DE	13 días	vie 05/07/24	mar 23/07/24					
80		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME	0 días	vie 05/07/24	vie 05/07/24					
81		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	0 días	vie 05/07/24	vie 05/07/24					
82		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M	4 días	mié 24/07/24	lun 29/07/24					
83		Sum. Electrodos E360	0 días	mié 24/07/24	mié 24/07/24					
84		Cimentacion muros nuevos (incluye encofrado , colocacion	3 días	mar 30/07/24	jue 01/08/24					
85		Colocacion muros de bloques de 0.15	1 día?	vie 02/08/24	vie 02/08/24					
86		Enchapes de muros nuevos con ladrillos Cara Vista	1 día?	lun 05/08/24	lun 05/08/24					
87		Encofrado y Hormigonado de cerramientos y dinteles	1 día?	mar 06/08/24	mar 06/08/24					
88		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES	5 días	mar 30/07/24	lun 05/08/24					
89		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	mar 06/08/24	jue 08/08/24					
90		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	15 días	vie 09/08/24	jue 29/08/24					

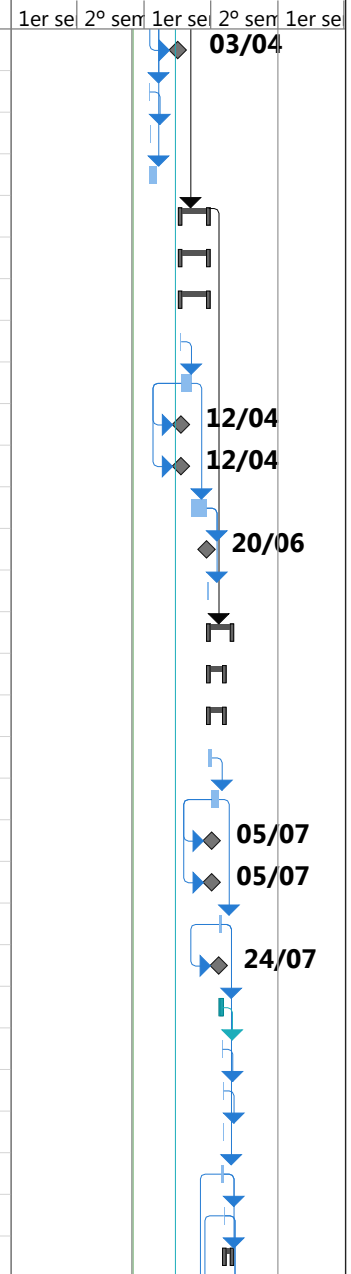


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
						1er sel	2° sen	1er sel	2° sen	1er sel
91		Sum. Hdrosanitaria Importacion	15 días	vie 09/08/24	jue 29/08/24					
92		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS	15 días	vie 09/08/24	jue 29/08/24					
93		Sum. Empotramientos electricos	15 días	vie 09/08/24	jue 29/08/24					
94		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 10(PE:	101 días	vie 09/08/24	vie 27/12/24					
95		CUBIERTA BLOQUE 10- ARTIMARCO FCBC	38 días	vie 09/08/24	mar 01/10/24					
96		[1306] Impermeabilizaciones	38 días	vie 09/08/24	mar 01/10/24					
97		ARTIMARCO FCBC	38 días	vie 09/08/24	mar 01/10/24					
98		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	3 días	vie 09/08/24	mar 13/08/24					
99		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO	10 días	mié 14/08/24	mar 27/08/24					
100		[126411] Colocacion de RasillasDE 290 X 140 X 12.5 MM	20 días	mié 28/08/24	mar 24/09/24					
101		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	mié 28/08/24	mié 28/08/24					28/08
102		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica	0 días	mié 28/08/24	mié 28/08/24					28/08
103		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	mié 28/08/24	mié 28/08/24					28/08
104		[139121]Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de	5 días	mié 25/09/24	mar 01/10/24					
105		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	mié 25/09/24	mié 25/09/24					25/09
106		[169012] LIMPIEZA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE HO FO O	2 días	mié 14/08/24	jue 15/08/24					
107		[179901] EXPLORACION SANITARIA PARA LOCALIZACION	2 días	vie 16/08/24	lun 19/08/24					
108		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	5 días	mié 14/08/24	mar 20/08/24					
109		INTERIOR TECHOS	26 días	mié 02/10/24	mié 06/11/24					
110		[1306] Impermeabilizaciones	26 días	mié 02/10/24	mié 06/11/24					
111		SERVIQUIMICA	26 días	mié 02/10/24	mié 06/11/24					
112		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	2 días	mié 02/10/24	jue 03/10/24					
113		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según	8 días	vie 04/10/24	mar 15/10/24					
114		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)	0 días	vie 04/10/24	vie 04/10/24					04/10
115		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte	0 días	vie 04/10/24	vie 04/10/24					04/10
116		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X	13 días	mié 16/10/24	vie 01/11/24					
117		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	vie 01/11/24	vie 01/11/24					01/11
118		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	lun 04/11/24	mié 06/11/24					
119		MUROS	37 días	jue 07/11/24	vie 27/12/24					
120		[1301] Albañileria	28 días	jue 07/11/24	lun 16/12/24					

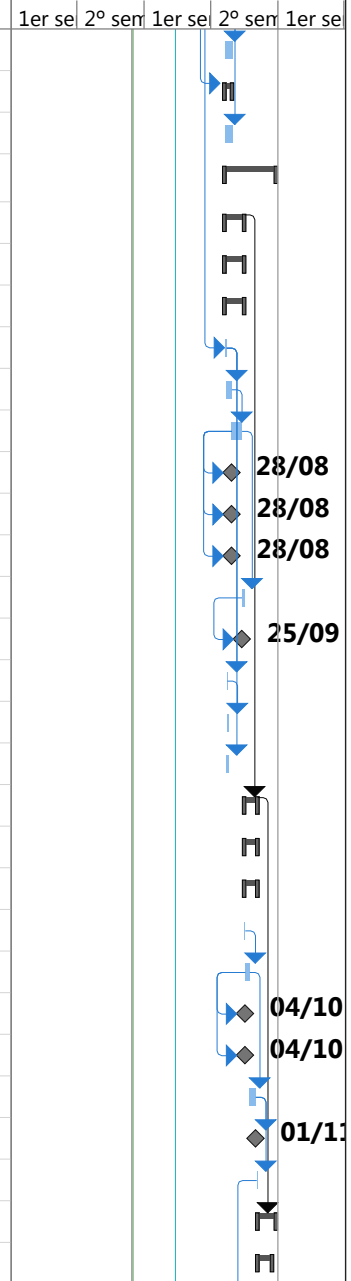


CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	1er sem 2º sem 1er sem 2º sem 1er sem		
121		SERVIQUIMICA	28 días	jue 07/11/24	lun 16/12/24			
122		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10	3 días	jue 07/11/24	lun 11/11/24			
123		[039322] RESTAURACION DE MUROS INTERIOR 0.115 M DE	13 días	mar 12/11/24	jue 28/11/24			
124		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24			12/11
125		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	0 días	mar 12/11/24	mar 12/11/24			12/11
126		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M	4 días	vie 29/11/24	mié 04/12/24			
127		Sum. Electrodo E360	0 días	vie 29/11/24	vie 29/11/24			29/11
128		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES	5 días	jue 05/12/24	mié 11/12/24			
129		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	3 días	jue 12/12/24	lun 16/12/24			
130		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	12 días	jue 12/12/24	vie 27/12/24			
131		<i>Sum. Hdrosanitaria Importacion</i>	12 días	jue 12/12/24	vie 27/12/24			
132		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS	12 días	jue 05/12/24	vie 20/12/24			
133		<i>Sum. Empotramientos electricos</i>	12 días	jue 05/12/24	vie 20/12/24			
134		Obra: FAT RESTAURACION BLOQUE # 11(PE:	162 días	lun 20/05/24	mar 31/12/24			
135		CUBIERTA BLOQUE 11- SERVIQUIMICA	85 días	lun 20/05/24	vie 13/09/24			
136		[1306] Impermeabilizaciones	85 días	lun 20/05/24	vie 13/09/24			
137		SERVIQUIMICA	85 días	lun 20/05/24	vie 13/09/24			
138		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	6 días	lun 20/05/24	lun 27/05/24			
139		[120315] Desmontaje de Rasillas (SEGÚN ESTADO FISICO	24 días	mar 28/05/24	vie 28/06/24			
140		[126411] Colocacion de Rasillas DE 290 X 140 X 12.5 MM	45 días	lun 01/07/24	vie 30/08/24			
141		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24			01/07
142		Sum. De Hidrato de Cal-Serviquimica	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24			01/07
143		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	lun 01/07/24	lun 01/07/24			01/07
144		[139121] Impermeabilizacion de Pretiles y Brocales de	10 días	lun 02/09/24	vie 13/09/24			
145		Sum. De Mortero con Base Cementicia(Contratado	0 días	lun 02/09/24	lun 02/09/24			02/09
146		[169012] LIMPIEZA HIDRAULICA EN TUBERIAS DE HO FO O	2 días	mar 28/05/24	mié 29/05/24			
147		[179901] EXPLORACION SANITARIA PARA LOCALIZACION	2 días	jue 30/05/24	vie 31/05/24			
148		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	30 días	mar 28/05/24	lun 08/07/24			
149		INTERIOR TECHOS	60 días	lun 16/09/24	vie 06/12/24			
150		[1306] Impermeabilizaciones	60 días	lun 16/09/24	vie 06/12/24			

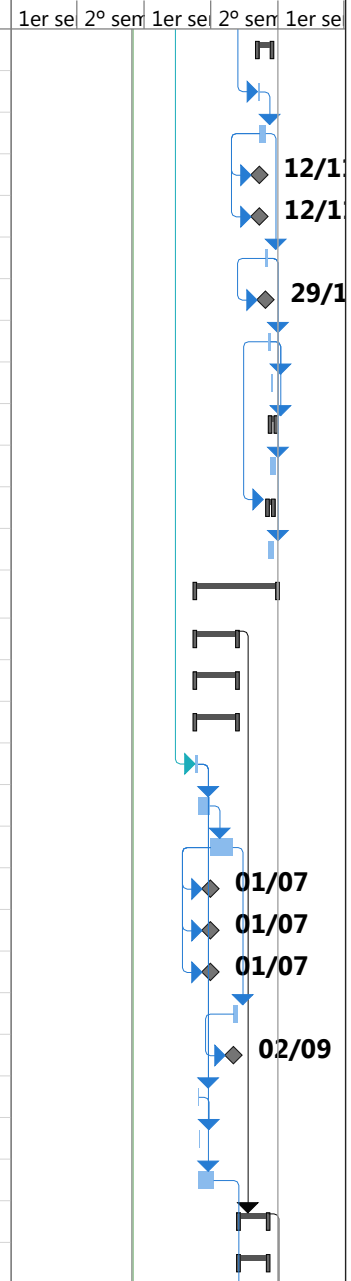






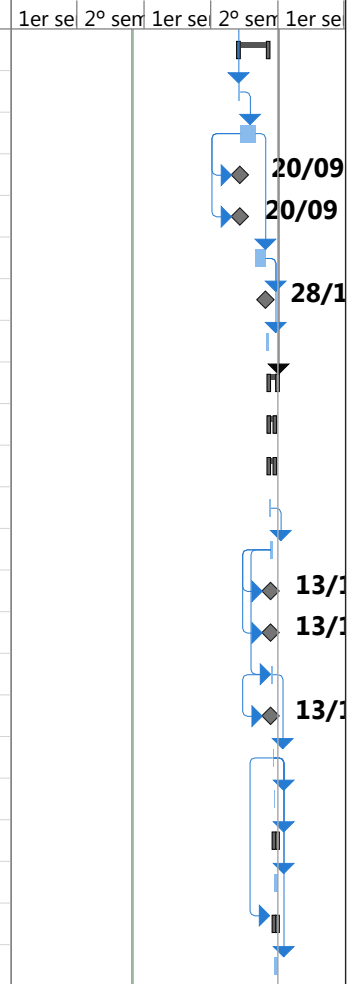











CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin					
						1er sel	2º sen	1er sel	2º sen	1er sel
151		SERVIQUIMICA	60 días	lun 16/09/24	vie 06/12/24					
152		[016711] TERRESTRE A VAGON DE MATERIAL SUELTO DE 50	4 días	lun 16/09/24	jue 19/09/24					
153		[120315] Desmonte de Rasillas Bajo Techos (parcial según	30 días	vie 20/09/24	jue 31/10/24					
154		Sum. De Shipjamer (de paleta hasta 5kg)	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24					
155		Sum. Pulidora 220 volt con disco de corte	0 días	vie 20/09/24	vie 20/09/24					
156		[126411] Colocacion de Rasillas bajo Techo DE 290 X 140 X	20 días	vie 01/11/24	jue 28/11/24					
157		Sum. De Rasillas (en obra)	0 días	jue 28/11/24	jue 28/11/24					
158		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	6 días	vie 29/11/24	vie 06/12/24					
159		MUROS	17 días	lun 09/12/24	mar 31/12/24					
160		[1301] Albañileria	12 días	lun 09/12/24	mar 24/12/24					
161		SERVIQUIMICA	12 días	lun 09/12/24	mar 24/12/24					
162		[030211] DEMOLICION DE MUROS DE LADRILLOS DE 0.10	4 días	lun 09/12/24	jue 12/12/24					
163		[039322]RESTAURACION DE MUROS INTERIOR 0.115 M DE	4 días	vie 13/12/24	mié 18/12/24					
164		Suministro Ladrillo Cara Vista-Por Contratar a MIPYME	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24					
165		Sum. De Productos Quimicos de Importacion	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24					
166		[098361] DE ARRIOSTRAMIENTO CERCHAS 12.0 M	3 días	vie 13/12/24	mar 17/12/24					
167		Sum. Electrodo E360	0 días	vie 13/12/24	vie 13/12/24					
168		[236125] APLICACION DE SELLADOR EN SUPERFICIES	3 días	mié 18/12/24	vie 20/12/24					
169		[316631] ARME Y DESARME DE ANDAMIOS METALICOS EN	2 días	lun 23/12/24	mar 24/12/24					
170		EMPOTRAMIENTOS HIDROSANITARIOS	7 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24					
171		Sum. Hdrosanitaria Importacion	7 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24					
172		EMPOTRAMIENTO ELECTRICOS	7 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24					
173		Sum. Empotramientos electricos	7 días	lun 23/12/24	mar 31/12/24					



CRONOGRAMA DETALLADO BLOQUES 4 , 5,10 Y 11 Plan 2024 (hasta empotramientos)

Proyecto: Proyecto1
 Fecha: jue 30/11/23

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin	
